



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.05.2016

Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh dodatku č. 3
 B - situace

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová

Důvodová zpráva:

V souvislosti s realizací akce „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001, žádá odbor investiční o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066.

Předmětem návrhu Dodatku č. 3 jsou vícepráce v hodnotě 300.000 Kč (247.934 Kč bez DPH) neobsažené v projektové dokumentaci, které byly nezbytné k realizaci a dokončení stavby.

Vícepráce:

- bourání stávající kanalizace DN 300 BEO v délce 101 m z důvodů nedostatečné hloubky uložení v místě nově budovaných silničních obrubníků;
- bourání stávající kanalizace DN 1000 TZB, 800 BEO v horní a spodní části ulice z důvodu zásahu do výkopu nově budované dešťové kanalizace - poloha a síla stěn stávající kanalizace v projektové dokumentaci nebyly shodné se skutečností, což mělo za následek bourání stávající stoky DN 1000 TZB, 800 BEO v podstatně delším úseku a větším rozsahu než byl předpoklad. Tuto masivní konstrukci o tl. stěn cca 50 cm bylo nutno bourat i v místech položení nově budovaných dešťových a splaškových kanalizačních přípojek;
- zalití úseků nevybourané stávající stoky DN 1000 TZB, 800 BEO cementopopílkovou zálivkou dodávku a montáž 6 kusů číchaček na plynovod DN 25 a DN 63 včetně chrániček.

Návrh nové sjednané ceny:

Cena díla dle SoD DPH	13.793.000 Kč bez DPH	16.689.530 Kč	vč.
Cena díla dle Dodatku č. 1 DPH	13.852.497 Kč bez DPH	16.761.521 Kč	vč.



Město Kuřim

Cena díla dle Dodatku č. 2 DPH	14.119.702 Kč bez DPH	17.084.839 Kč	vč.
Cena díla dle Dodatku č. 3 DPH	14.367.635 Kč bez DPH	17.384.839 Kč	vč.

Vícenáklady ve výši 300.000 Kč budou čerpány z ORG č. 1 149 000 000 „ Ul. Hybešova - oddílný systém kanalizace“.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací za bourání stávajících kanalizací ve výši 300.000 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 17. 6. 2016 (OI)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

2014/D/0066/3

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 18. listopadu 2014

č. SoD objednatele: 2014/D/0066

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
jednající: starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
jednající ve věcech technických: Ing. Pavla Kubová
tel.: 541 422 375
e-mail: kubova@radnice.kurim.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Subjekt je zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
IČ: 425344447
DIČ: CZ25344447
statutární zástupce: Jiří Peřina, jednatel
jednající ve věcech technických: Jaromír Kocián, výrobní ředitel
stavbyvedoucí, tel.: 724 469 791
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 176725996/0300
(dále jen zhotovitel)

název akce: „**Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova**“,
evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001

Dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo č. 2014/D/0066, uzavřená dne 18. listopadu 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2015 a č. 2 ze dne 13. 11. 2015.

I.

Čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, odst. 2.1 se rozšiřuje o 2.1.10
2.1.10

Bourání stávající kanalizace DN 300 BEO v délce 101 m (po pravé straně od ul. Tyršova) z důvodů nedostatečné hloubky uložení v místě nově budovaných silničních obrubníků.

Bourání stávající kanalizace DN 1000 TZB, 800 BEO v horní a spodní části ulice (po levé straně od ul. Tyršova) z důvodu zásahu do výkopu nově budované dešťové kanalizace - poloha a síla stěn stávající kanalizace v projektové dokumentaci nebyly shodné se skutečností.

Zalití úseků nevybourané stávající stoky DN 1000 TZB, 800 BEO cementopopílkovou zálivkou (po levé straně od ul. Tyršova).

Dodávku a montáž 6 kusů číchaček na plynovod DN 25 a DN 63 v ul. Hybešova včetně chrániček.

Jedná se o rozšíření rozsahu díla objednatelem - práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

II.

Čl. 3 Termíny a místo dokončení, odst. 3.2.1 se nemění a zní takto:

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo nejpozději do **31. května 2016**

III.

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.1 se mění a nově zní takto:

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena včetně DPH	17 384 839,00 Kč
Cena bez DPH	14 367 635,00 Kč
DPH 21 %	3 017 204,00 Kč

IV.

Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2014/D/0066 zůstávají nezměněny.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kuřimi č. j./2016 dne 31.5.2016

V Kuřimi, dne 31.5.2016

Za objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.5.2016

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti

horní část - ul. HYBEŠOVA

ČÁST 3 16,5 m
ČÁST 4 14 m
ČÁST 5 18 m

TOUCHA BOURANÉ JTOEY DLE P.D.

PŘELOŽKA VODOVODU DN 80, d. 128,35


ANALIZACE I
VA DN 300, d. 160,00m

BOURANÁ KANALIZACE
DN 800, 1000 T2B

BOURANÁ KANALIZACE
DN 300 BEO

SKUTEČNÁ POLOHA
BOURANÉ JTOEY

FOTO
0058
5903

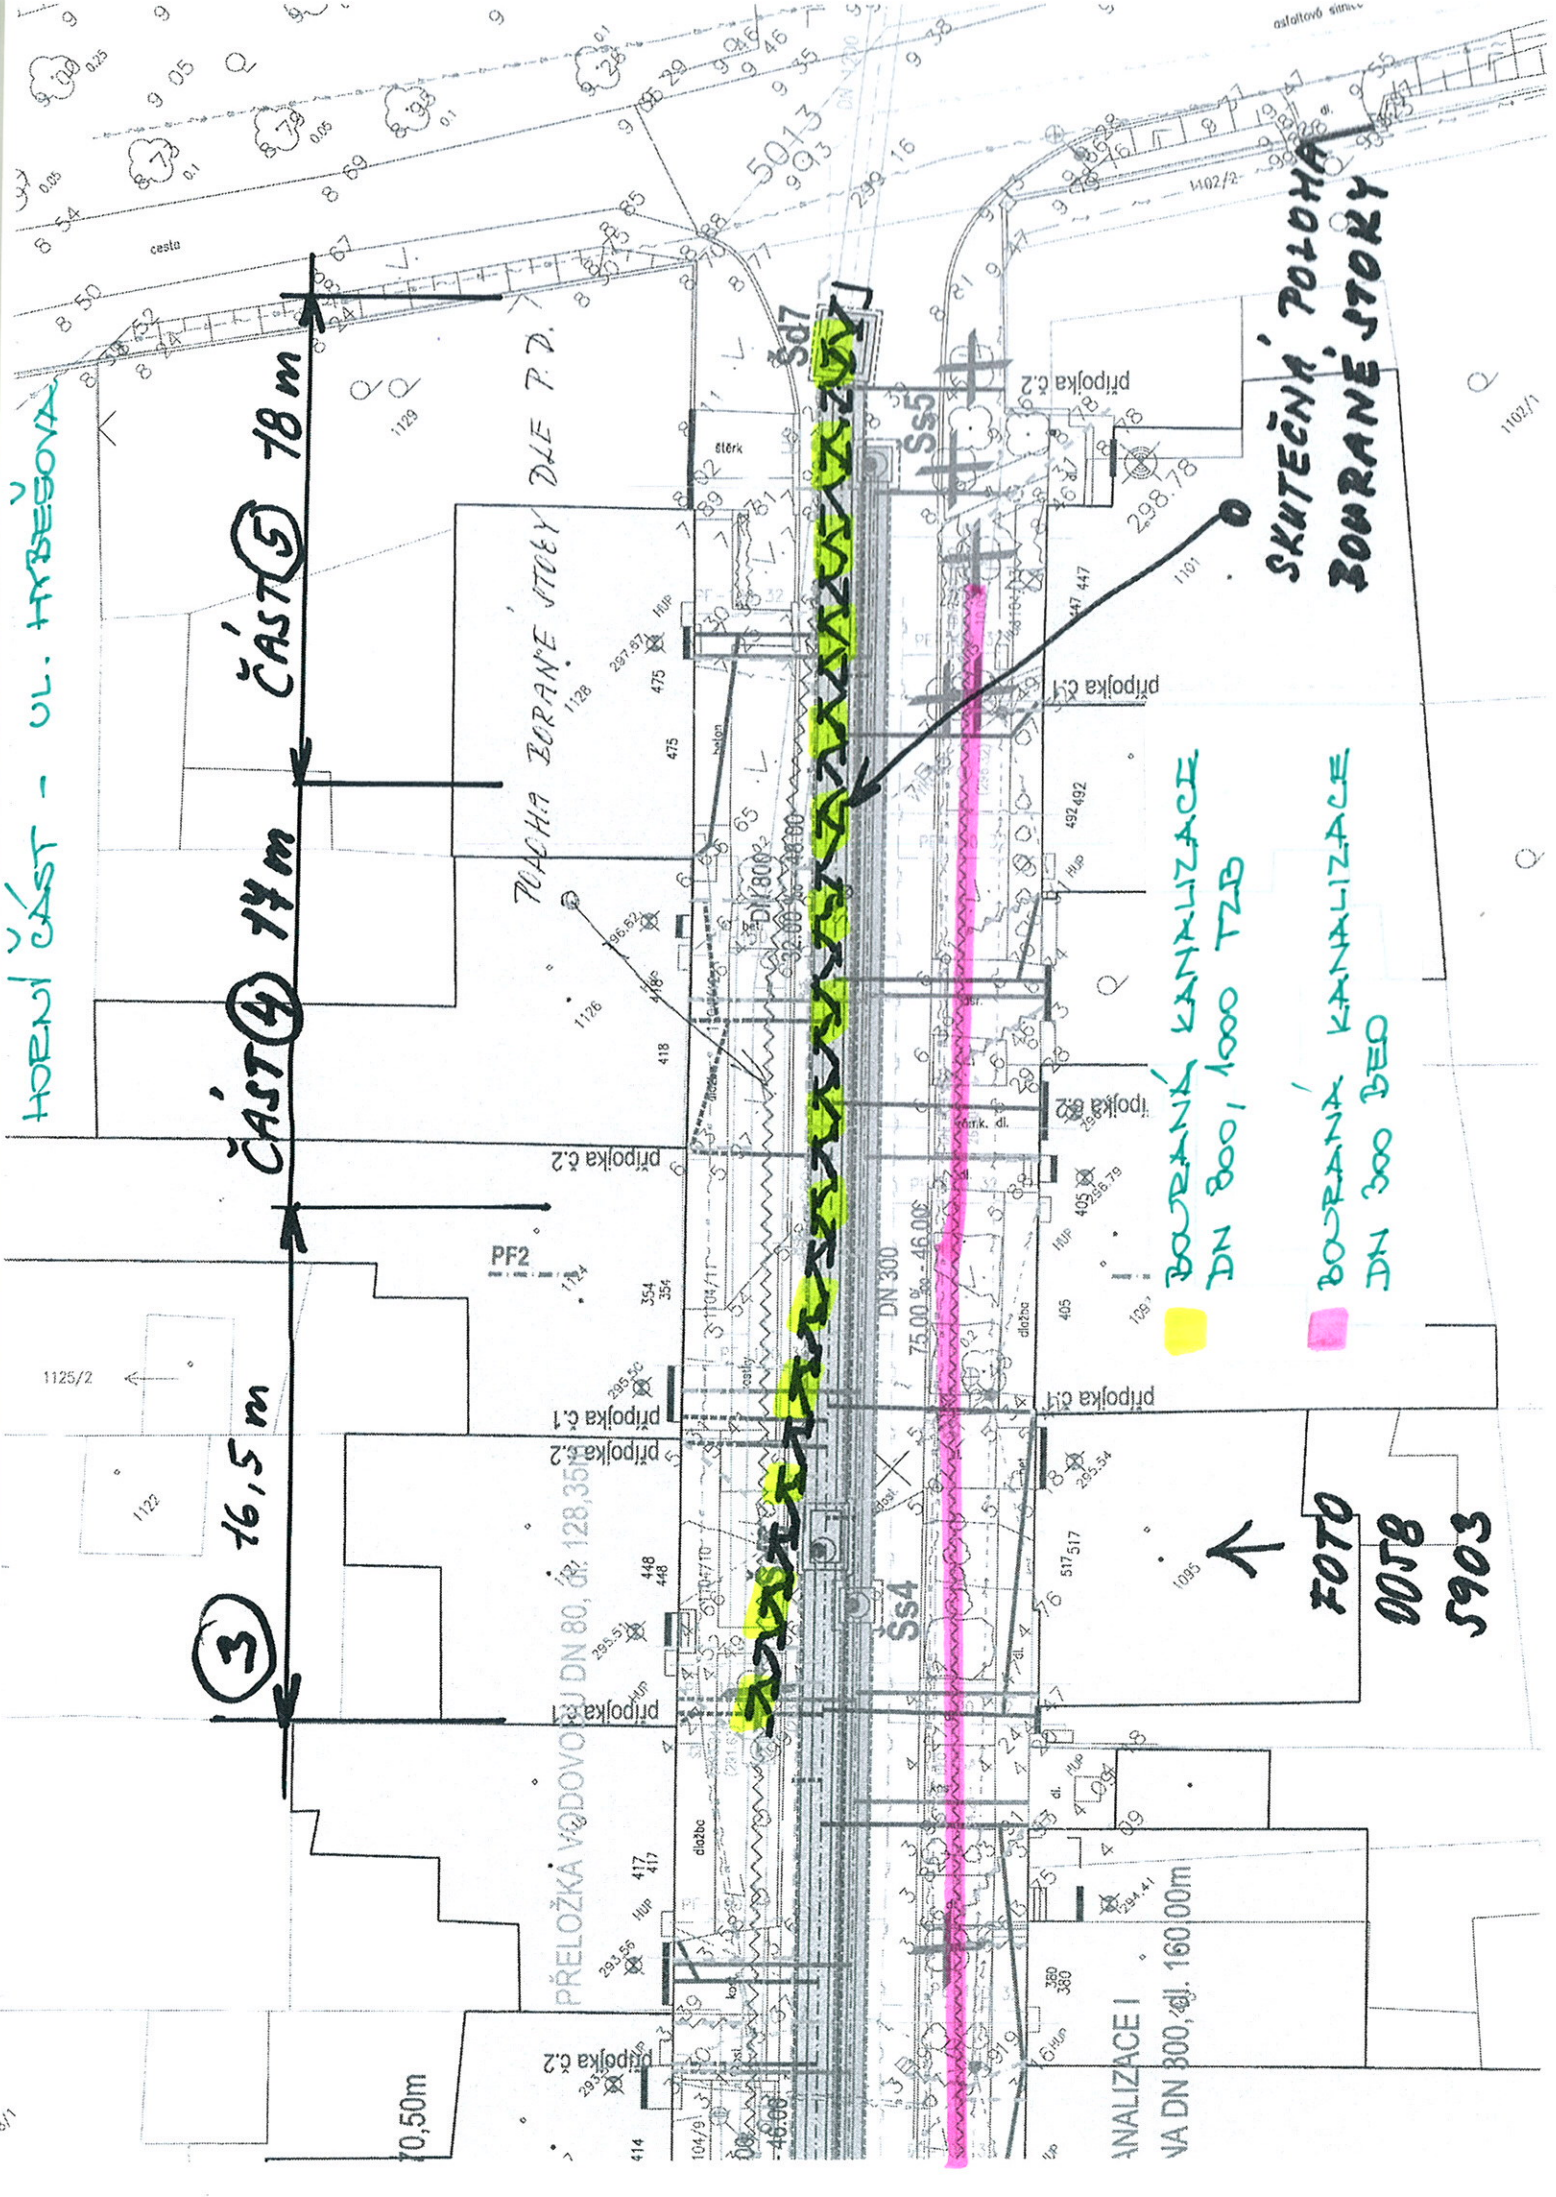

SPOTNY CAST - GL. HYPERSONA

Číslo 21 25 m

CAIT 1 21,5 m

BOBANA VANA JZACH

DN 00 T250

BORENA VANALINACH

7A 300 B40

Č. 16,80m
